


Critical Path Method

Με βάση το παράδειγμα της άσκησης που λύσαμε στην ενότητα PERT (βλέπε και παρακάτω κομβικό δίκτυο), και τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα, περιγράψτε τις δυνατότητες χρονικής συμπίεσης του έργου όταν τα έμμεσα κόστη ανέρχονται σε 20.000 € ανά εβδομάδα.

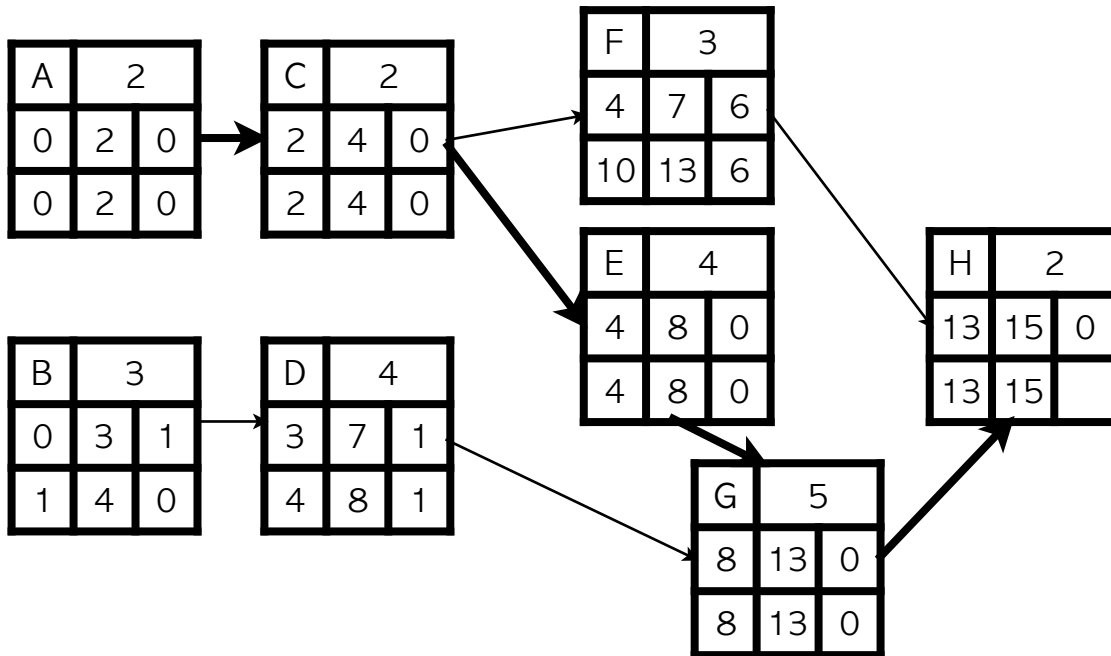

Δραστηριότητα	Κανονική Διάρκεια	Κανονικό κόστος	Συμπεσμένη διάρκεια	Κόστος συμπεσμένη δραστηριότητας	Κλίση
A	2	€80.000	1	€100.000	€20.000
B	3	€70.000	2	€85.000	€15.000
C	2	€90.000	2		
D	4	€60.000	3	€80.000	€20.000
E	4	€50.000	3	€60.000	€10.000
F	3	€35.000	2	€40.000	€5.000
G	5	€25.000	3	€50.000	€12.500
H	2	€25.000	2		
